

賃金等の変動に対する

工事請負契約約款第25条第6項（インフレスライド条項）

運用マニュアル（暫定版）

平成26年3月

（令和3年1年改訂）

光市入札監理課

はじめに

本資料は、工事請負契約約款（以下「契約書」という。）第25条第6項のインフレスライド条項及び「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の運用基準」（以下「本運用」という。）に関するスライド額の算定方法や発注者及び受注者間における協議等についての考え方を整理したものである。

本資料において、出来形数量の確認や残工事量の算出等において疑義が生じた場合は、入札監理課と必要に応じ相談等を行い、円滑な執行に努められたい。

1 適用対象工事

インフレスライド条項の請求ができる工事は、以下の条件を満たす工事とする。

- (1) 入札公告又は指名通知後、工期末までに賃金水準の変更がなされた工事。
- (2) 残工期が基準日から2ヶ月以上ある工事。

(1) 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い

項目	全体スライド (契約書第25条第1項から第4項)	単品スライド (契約書第25条第5項)	インフレスライド (契約書第25条第6項)
適用対象工事	工期が12ヶ月を超える工事 ただし、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事)	すべての工事 (運用通達発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事)	すべての工事 ただし、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 (本運用発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事)
請負額 変更の 方法	対象	請負契約締結の日から12ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等	部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材 (鋼材類、燃料油類等)
	受発注者の負担	本運用に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等	残工事費の1.5%
再スライド	対象工事費の1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし)	可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能)	残工事費の1.0% (契約書第29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。)
	なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない)	可能 (本運用に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)	

2 請求日及び基準日等について

請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。

- (1) 請求日：発注者又は受注者が請負代金の額の変更の協議（以下「スライド協議」という。）を請求した日とする。
- (2) 基準日：請求日とすることを基本とする。
また、請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることもできる。
- (3) 残工期：基準日以降の工事期間とする。

(1) 請求日について

請求に際しては、残工事の工期が基準日から2ヶ月以上必要であることに留意すること。

(2) 基準日について

発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難しい場合は、請求日から14日以内の範囲で定める。

(3) 残工期について

残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示等（工事打合簿により確認できること）により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができる。

3 スライド協議の請求

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。

(1) スライド対象の確認

スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金の額により判定することを基本とする。

(2) スライド協議の請求について

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面（別紙様式1-1又は1-2）により行うこととする。書面には、変更請求概算額算定資料、概算残工事請負代金算定資料を添付するものとする。

また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。

なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。

(3) スライド額協議開始日について

発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者の書面（別紙様式2）により通知する。

（4）実施フローについて

別紙1「工事請負契約約款第25条第6項に伴う実施フロー」別紙2「増額の場合のインフレ・スライド額算定作業フロー」を参照すること。

4 請負代金の額の変更

（1）賃金水準又は物価水準の変動による請負代金の額の変更額（以下「スライド額」という。）は、当該工事に係る変動額のうち請負代金の額から基準日における出来形部分に相応する請負代金の額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。

（2）増額スライド額については、次式により行う。

$$S_{\text{増}} = [P_2 - P_1 - (P_1 \times 1 / 100)]$$

この式において、 $S_{\text{増}}$ 、 P_1 及び P_2 は、それぞれ次の額を表すものとする。

$S_{\text{増}}$: 増額スライド額

P_1 : 請負代金の額から基準日における出来形部分に相応する請負代金の額を控除した額

P_2 : 変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出した P_1 に相当する額

（ $P = \alpha \times Z$ 、 α : 請負比率（当初請負代金の額／当初設計額）、 Z : 発注者積算額）

（3）減額スライド額については、次式により行う。

$$S_{\text{減}} = [P_2 - P_1 + (P_1 \times 1 / 100)]$$

この式において、 $S_{\text{減}}$ 、 P_1 及び P_2 は、それぞれ次の額を表すものとする。

$S_{\text{減}}$: 減額スライド額

P_1 : 請負代金の額から基準日における出来形部分に相応する請負代金の額を控除した額

P_2 : 変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出した P_1 に相当する額

（ $P = \alpha \times Z$ 、 α : 請負比率（当初請負代金の額／当初設計額）、 Z : 発注者積算額）

（4）スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。

（1）受注者の負担割合

受注者の負担割合については、契約書第29条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100分の1」としている。

（2）基準日における特別調査又は見積価格採用単価について

再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時に類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。

（3）複数回スライドを行う場合について

スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金の額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。

5 出来高数量の確認

- (1) 基準日における残工事を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとする。
- (2) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱う。
 - ア 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
 - イ 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等（架設用クレーン、仮設鋼材など）の設置費及び賃料等も出来形の対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。
 - ウ 契約書にて、工事材料の売買契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
- (3) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
- (4) 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
- (6) 基準日までに変更契約を行っていないが工事打合簿により先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事はスライドの対象とすること。

(1) 出来形数量等の確認方法について

基準日における工事の出来形数量の確認については、本運用5に基づき実施することを基本とする。

なお、最近の労働市場実勢価格を適切・迅速に反映し、技能労働者等への適切な水準の賃金の支払等を促進する必要があることから、当面、受注者に「工事出来高内訳書」、「実施工程表付き工事履行報告書」及び「出来高状況写真」の提出を求め、これにより、数量総括表に対応した出来高を確認できることとする。

ア 「工事出来高内訳書」による出来高の確認

「工事出来高内訳書」は、数量総括表に「出来形数量」欄、「残工事数量」欄を追加したものとし、「工事出来高内訳書」に記載された出来形数量により、数量総括表に対応した出来形数量を確認する。

イ 「実施工程表付き工事履行報告書」による出来高の確認

「工事出来高内訳書」による確認が困難なものについては、実施工程表を添付した基

準日までの工事履行報告書により、次式により数量総括表に対応した出来高を確認する。(ただし、実施工程表は、基準日までに作成されたものとする。)

$$\text{出来形数量} = \text{基準日における設計数量} \\ \times (\text{基準日における実施済工程工期} / \text{実施工程工期})$$

ウ 「出来高状況写真」による出来高の確認

「工事出来高内訳書」の工種に対応した「出来高状況写真」により、数量総括表に対応した出来形数量を確認する。

(2) 出来形数量等の確認時期について

発注者は、請求日から14日以内に出来高確認を行う。

6 物価指数

発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。

(1) 積算に使用する単価について

変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。

(2) 基準日における特別調査又は見積価格採用単価について

再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時に類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。

7 変更契約の時期

スライド額に係る契約変更は、スライド協議が整った後、速やかに行うことを原則とするが、精算変更時点で行うこともできる。

(1) 精算変更時に行う場合

スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。

8 全体スライド及び単品スライド条項の併用

(1) 契約書第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金の額の変更を実施した後であっても、本運用によるスライドを請求することができる。

(2) 本運用に基づき請負代金の額の変更を実施した後であっても、契約書第25条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金の額の変更を請求することができる。

- (1) 契約書第25条第6項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まずインフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。その上で、インフレスライド条項との重複を防止するため、インフレスライド条項の対象とした数量については、変動前の単価をインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
- (2) また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の1%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることとなり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
- (3) このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の1%を受注者の負担とするが、インフレスライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、インフレスライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の1%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方にに基づき、単品スライド条項に係る1%分の負担を求めないこととした。
- (4) さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。

工事請負契約約款第 25 条第 6 項に伴う実施フロー

期限等	手続き項目	様式	備考
	請求日 (基準日)	別紙 様式 1-1 様式 1-2	発注者又は受注者から請求 ※基準日は、請求日とすることを原則とする。
7 日以内 (※1)	協議開始日の決定 スライド額協議開始日の通知	別紙 様式 2	発注者から受注者に通知
2 ヶ月以上 (※2)	出来高確認 残工事量算定 スライド額算定 スライド額協議開始	別紙 様式 3-1 様式 3-2	受発注者で協議書取り交わし (発注者→受注者)
14 日以内 (※1)	スライド額確定	別添 承諾書	(受注者→発注者)
	スライド変更契約		精算変更時点で行うことができる
	工期末		


(※1) 契約書で規定

(※2) 本運用で規定

増額の場合のインフレ・スライド額算定作業フロー

期日等	作業項目	作成様式	備考
請求日	請負代金の額の変更の請求	添付書類 1 工事出来高内訳書 2 工事履行報告書 3 実工程表 4 出来高状況写真 5 変更請求概算額算定資料 6 概算残工事請負代金算定資料	受注者が作成、提出
	出来高数量確認		発注者による確認 (請求から14日以内) ※本資料で規定
①	出来高額 P0、残工事額 P1の算定	出来高積算 残工事額(P1)計算書 (エクセルシートA)	発注者が算定
②	残工事額(新単価) P2の算定	(P0+P2)積算	発注者が算定 変更積算書を出来高分で積算したものに、新単価で残工事を積算した積算書を合併して算出。 (当初積算から契約保証金額を引継ぎ)
③	スライド額の算定(判定)	インフレスライド計算書 (エクセルシートB)	発注者の作成
スライド額協議開始日	スライド額協議(算定結果通知)		発注者→受注者
スライド額確定	承諾書の提出		受注者→発注者

【スライド額算定イメージ図】

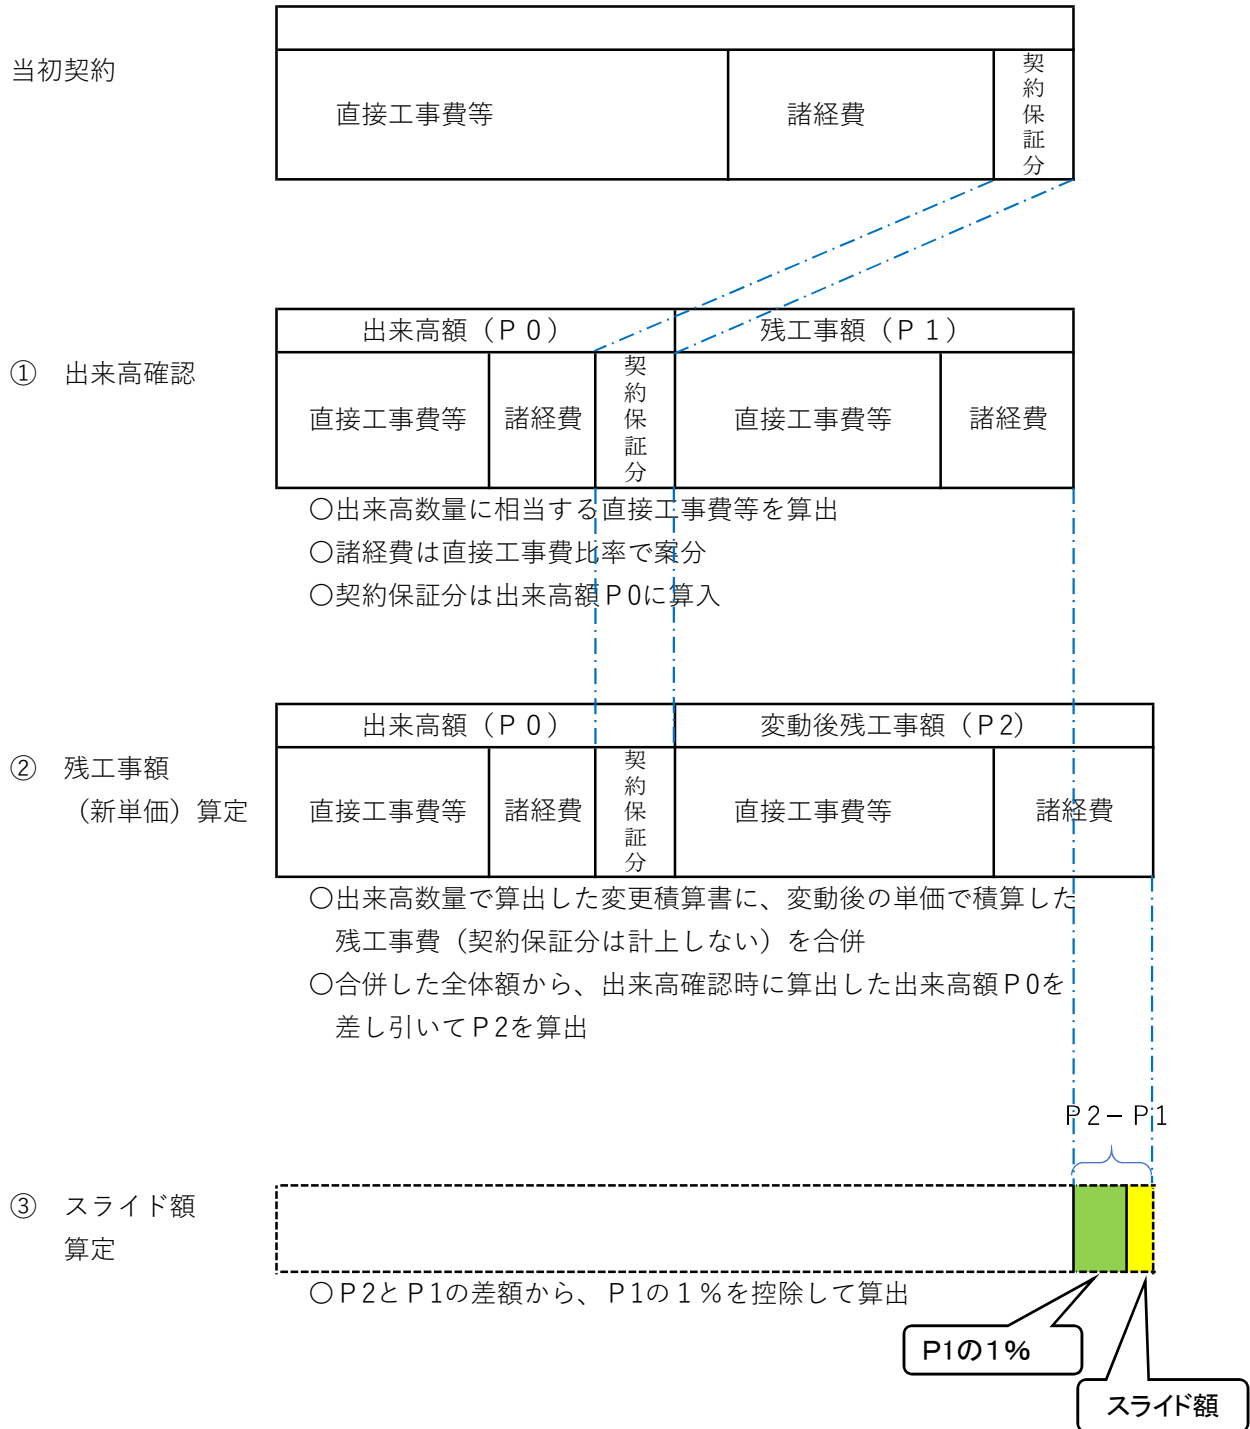

※残工事額 (新単価) 算定は、当初積算時の歩掛と変動後の単価で行う。
