


「週休2日モデル工事」対象工事の発注から工事完成までの実施フロー

【受注者希望型】

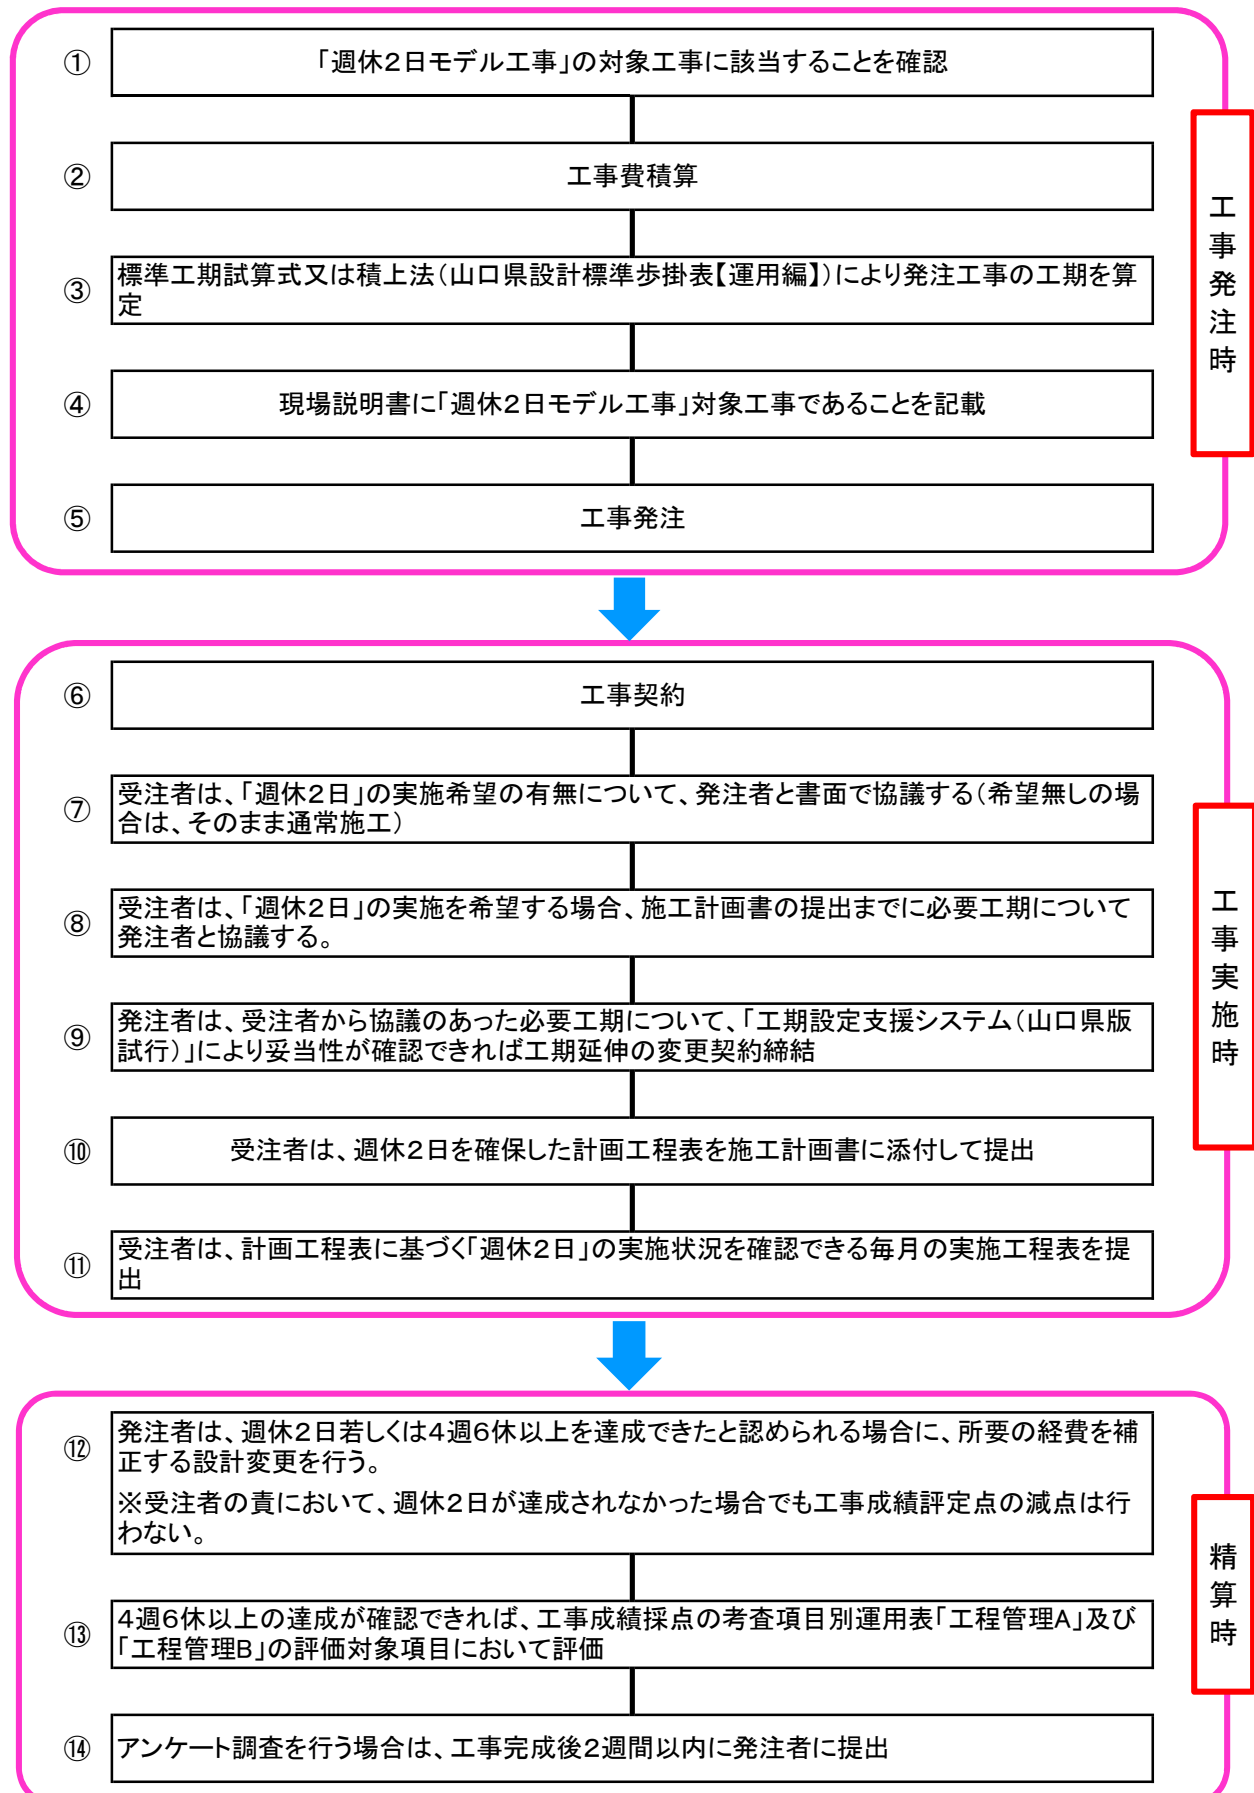

工事工程表（参考様式）作成例

【別紙1】

工事名： ○○工事

表は、行、列の追加など適宜加工して用いること。

| 担当 | 主要工種等 | 令和 年度 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|-----|-----------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------------------------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 受注者 | 準備工 | ★ | | | | | | | | | | | | 4/10着手 30日間 |
| | ○○工 | | | | | | | | | | | | | |
| | ○○工 | | | | | | | | | | | | | |
| | ○○工 | | | | | | | | | | | | | |
| | ○○工 | | | | | | | | | | | | | |
| | ○○工 | | | | | | | | | | | | | |
| | ○○工 | | | | | | | | | | | | | |
| | 後片付け | | | | | | | | | | | | | ★ |
| 発注者 | 関連工事 | | | | | | | | | | | | | ○○工事 |
| | 借地 | | | | | | | | | | | | | |
| | 関係機関協議 | | | | | | | | | | | | | 4月～5月 |
| | 支障物件（○○） | | | | | | | | | | | | | 5月移設予定 |
| | 夏季休暇、年末年始 | | | | | | | | | | | | | 8/13-8/15 12/28-1/3 |

準備と後片付けは、工程上見込んでいる期間を明示する。

全体工期を設定する上で影響しない工種については、工程表に記載しなくてもよい。

地域の実状や自然条件などを踏まえ適宜設定

特記仕様書に記載のある、工程計画に影響のある制約条件については、全て記載する。

注) 本工事工程表は参考資料であるため、契約上の拘束力を生じるものではない。
 工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
